

**Stand van zaken en planning der werken**

Projectnummer: **21.856**  
Projectnaam: **PS+PL Wijtschatestraat-Vierstraat naar gemeentelijke riool**

**Laatste update:** 10 januari 2018

**Duur van de werken**


Startdatum: 7 augustus 2017  
Vermoedelijke einddatum: 31 mei 2020

Het project werd opgedeeld in fasen waarvan sommige gelijktijdig worden uitgevoerd. Bij de planning van de werken wordt er op toegezien dat de woningen maximaal bereikbaar blijven. De timing van de werken vindt u hierna. Hou er wel rekening mee dat deze planning informatief is en steeds afhankelijk van onvoorziene omstandigheden (o.a. weerverlet).

**Timing & Fasering**

<b>Fase</b>	<b>Plaats – omgeving werken</b>	<b>Timing</b>
<b>1</b>	<b>Wijtschatestraat</b>	<b>augustus 2017 – maart 2018</b>
<b>2</b>	<b>leperstraat – noordelijk deel, vanaf kruispunt met Staanijsstraat &amp; Houthemstraat</b>	<b>februari 2018 – juli 2018</b>
<b>3</b>	<b>Hospicestraat &amp; Sint-Medardusplein Noord</b>	<b>augustus 2018 – december 2018</b>
<b>4</b>	<b>Vierstraat</b>	<b>januari 2019 – april 2019</b>
<b>5</b>	<b>Schoolstraat &amp; leperstraat – zuidelijk deel, vanaf kruispunt met Staanijsstraat &amp; Houthemstraat</b>	<b>mei 2019 – november 2019</b>
<b>6</b>	<b>Staanijsstraat, Houthemstraat &amp; Sint-Medardusplein Zuid en Oost</b>	<b>december 2019 – mei 2020</b>

# Grote omleiding voor niet-plaatselijk verkeer

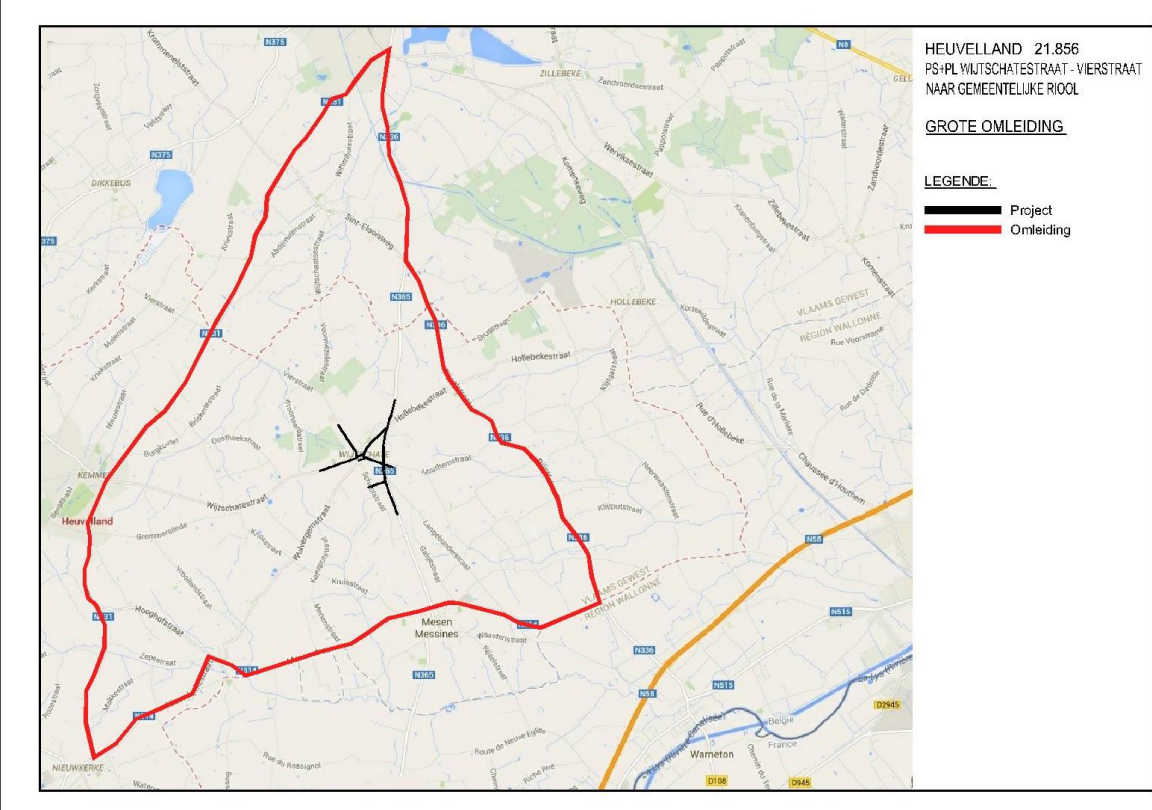

## Nutsmatenschappen (fase 0)


Start: begin augustus 2017  
Vermeedelijke duur: 5 maanden

Binnen deze fase zullen de nutsmatenschappen werken uitvoeren voorafgaand aan de rioleringsaanleg.

### Planning:

- 18 september 2017: start nutswerken in de Ieperstraat, ten noorden van het kruispunt met de Staanijsstraat

### Omleiding:

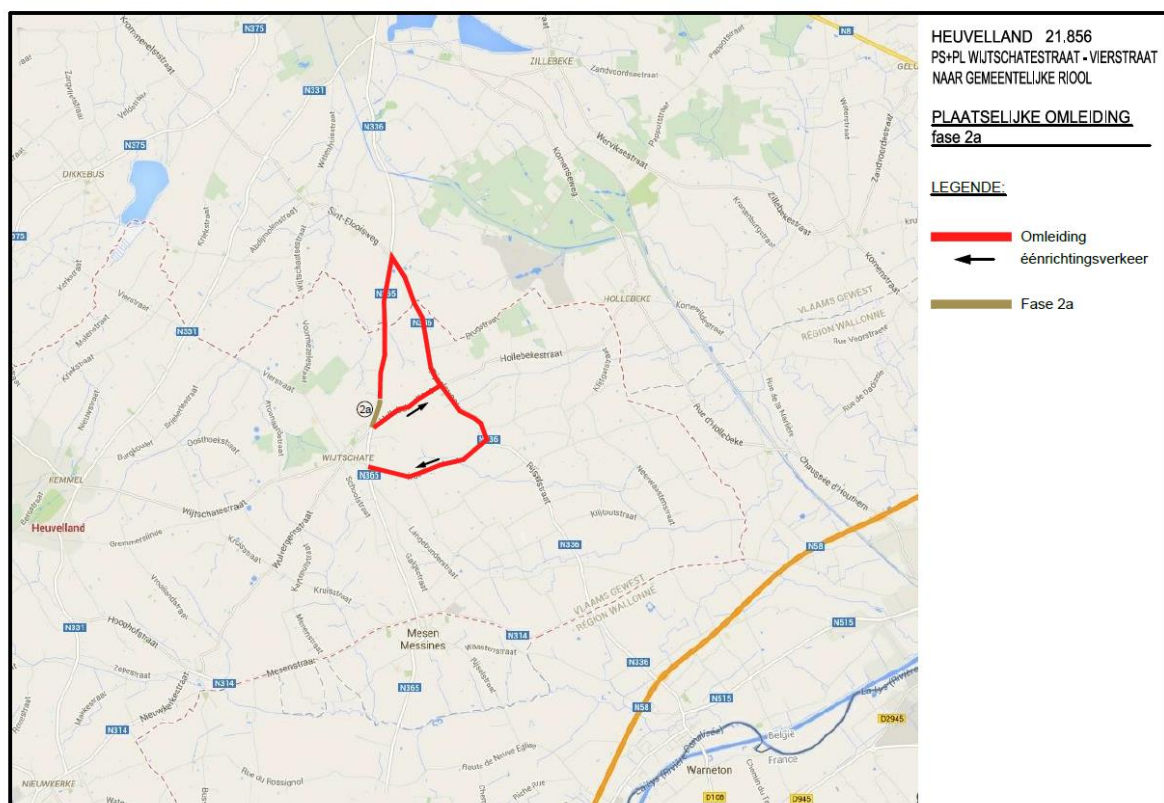

## Wijtschatestraat (fase 1)

Start: eind augustus 2017

Vermoedelijke duur: 8 maanden

Binnen deze fase van de werken wordt er een nieuwe afvalwater- en hemelwatercollector en persleiding aangelegd, alsook een pompstation gebouwd.. De weg wordt onderbroken voor het verkeer.

### Planning:


Zone van huisnummer 124 / 71 richting St-Medardusplein:

- Periode vanaf 10 tot eind januari 2018:
  - aanleg riolering – regenwater (resterende 10m)
  - uitvoeren huisaansluitingen

Zone van huisnummer 104 richting Kimmel:

- Periode vanaf 10 januari 2018:
  - Betonning rijwegverharding  
**(BELANGRIJK: het wegdek moet een 3-tal dagen uitharden. In die tussentijd mag het wegdek niet betreden worden!)**

### Omleiding:

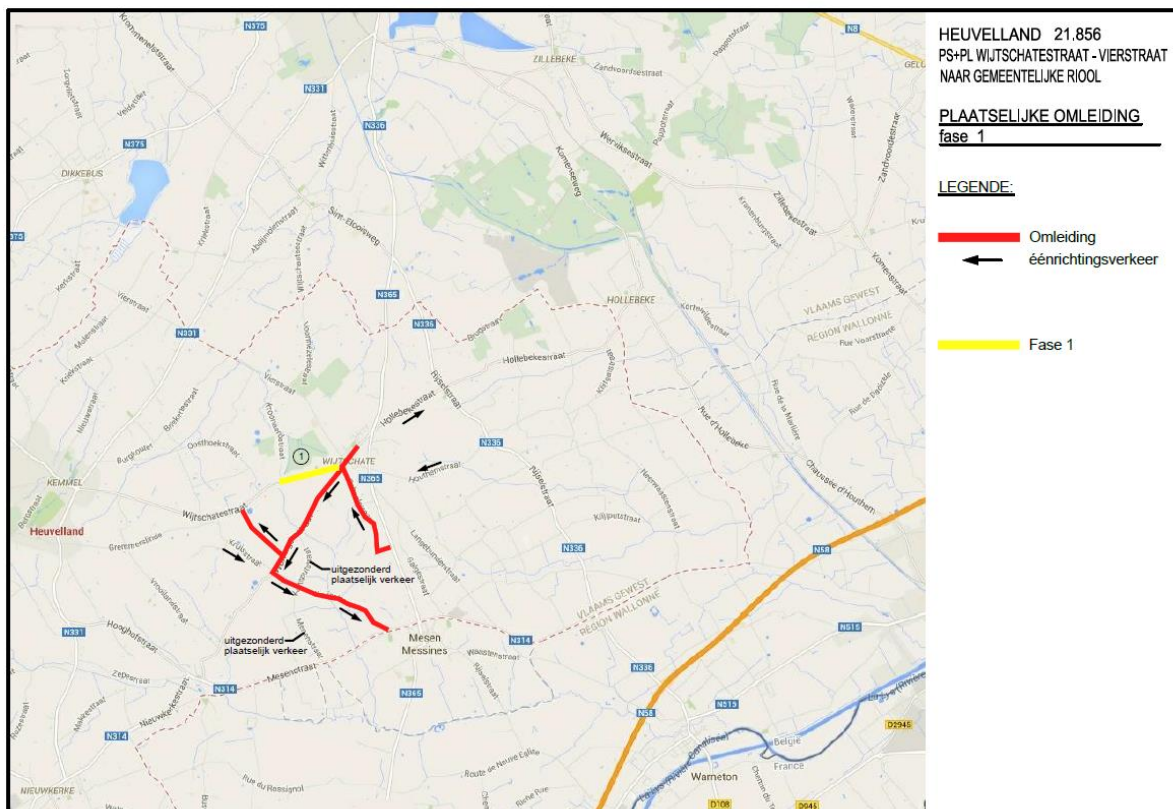

## leperstraat – noordelijk deel, vanaf kruispunt Staanijerstraat & Houthemstraat (fase 2)

Start: midden februari 2018


Vermoedelijke duur: 6 maanden

Binnen deze fase van de werken wordt er een nieuwe afvalwater- en hemelwatercollector aangelegd, alsook een 3-tal overstorten gebouwd.. De weg wordt onderbroken voor het verkeer.

### Planning:

...

### Omleiding:

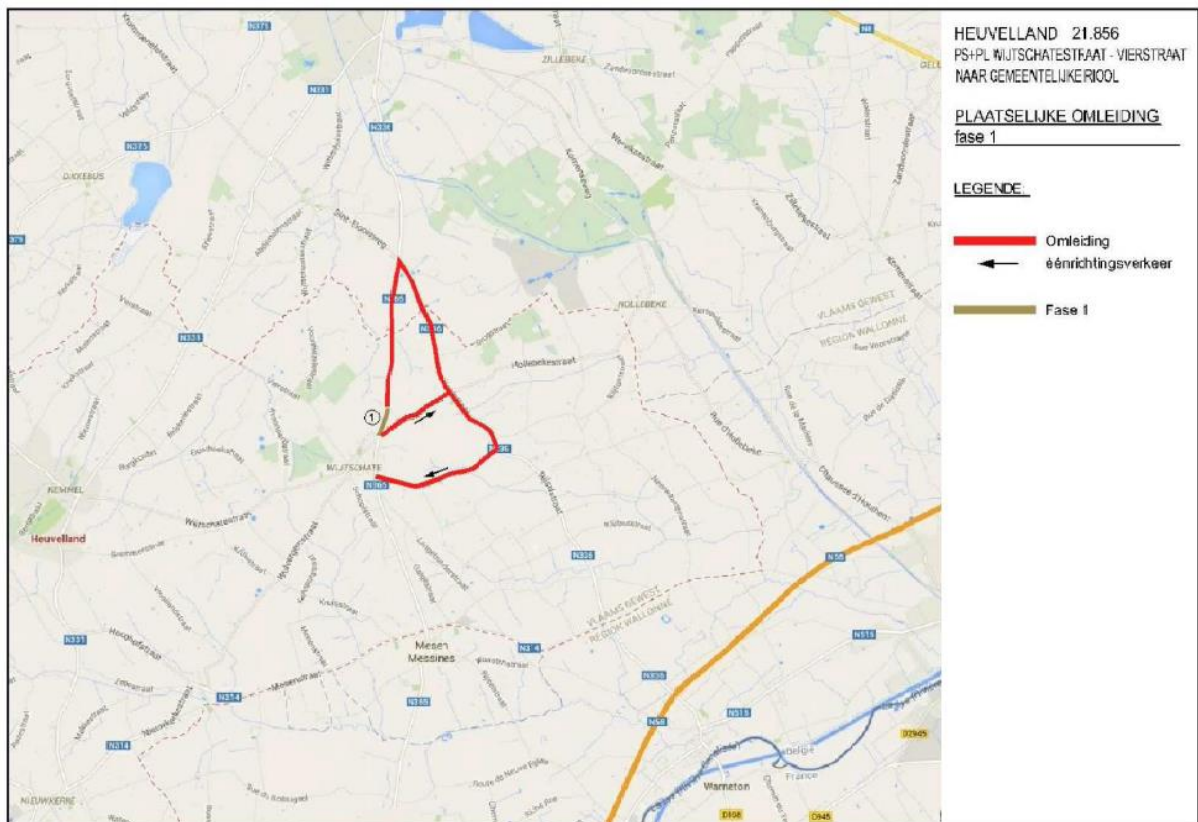

## Toegankelijkheid

Door de werken is er hinder te verwachten voor de omwonenden. Dit betekent dat de toegang tot de woningen beperkt zal zijn en dat er geen doorgaand verkeer is toegelaten. Plaatselijk verkeer blijft mogelijk maar tijdens de werkuren (van 7u 's morgens tot 16u30) zal ook dit op bepaalde momenten moeilijk zijn. De verkeersborden en eventuele aanwijzingen van de aannemer dienen gerespecteerd te worden.

De aannemer dient een degelijke 'Minder Hinder'-steenslag te voorzien zodat tijdens de werken de woningen maximaal toegankelijk kunnen blijven.

## Afvalophaling

Tijdens de werken kan de vuilniswagen niet door de straat rijden. Daarom vragen we u uw huisvuil op de normale ophaaldagen naar de dichtstbijzijnde bereikbare hoek van de straat te brengen. Is dit voor u onmogelijk, laat dit dan even weten aan de werfleider van de aannemer zodat samen gezocht kan worden naar een oplossing.

## Verhuis of levering: informeer ons

U kunt ons ook helpen de werken vlot te laten verlopen, door ons tijdig te laten weten wanneer u eventueel een verhuis plant, of misschien een bijzondere levering verwacht, zodat onze aannemer hier rekening mee kan houden.

**Gelieve er rekening mee te houden dat de planning van de werken informatief is en steeds afhankelijk van onvoorziene omstandigheden (o.a. weerverlet).**
