


Beste bewoner,

Via de deze weg willen wij u nogmaals op de hoogte brengen van de werkzaamheden die binnenkort zullen uitgevoerd worden. Gelieve er rekening mee te houden dat de aangehaalde data in deze brief informatief zijn en nog kunnen wijzigen, onder andere door de weersomstandigheden (regen, stormen,...).

Fase 1 – Koppeleikenstraat en Kumtichsestraat

De riolering in de Koppeleikenstraat en Kumtichsestraat werd reeds aangelegd. Hierdoor starten we aan de afwerking van de rijweg. Als eerste worden de boordstenen gegoten met een glijbekistingsmachine. Deze machine verwerkt het beton stapvoets in de gewenste vorm. De aanleg is voorzien op 18, 19 en 20 oktober.

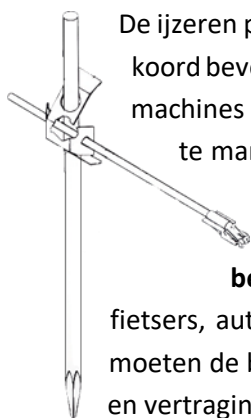

De ijzeren priemen die op regelmatige afstand geplaatst worden en waaraan een koord bevestigd wordt, dienen om de hoogte en afstand aan te geven zodat onze machines correct kunnen werken. Wij vragen uitdrukkelijk om deze koord niet te manipuleren. Waar mogelijk zullen wij plaatsen voorzien zodat u aan de andere kant van de gespannen koord kan geraken.

Wij vragen u ook met aandrang om de pas aangelegde betonverharding niet te betreden of te beschadigen (voetgangers, fietsers, auto's, huisdieren, handschriften e.d.). Bij weigering door het bestuur moeten de beschadigde delen terug opgebroken worden met alle hinder, kosten en vertragingen tot gevolg.



20 oktober starten we met de aanleg van de fundering van de rijweg in de Kumtichsestraat. Op 21 en 22 oktober zal de fundering van de rijweg geplaatst worden in de Koppeleikenstraat.

Na het plaatsen van de fundering volgt de onderlaag asfalt in de Koppeleikenstraat. Dit is voorzien om op 25 oktober te plaatsen. Dezelfde dag zal de onderlaag en toplaag asfalt geplaatst worden op het kruispunt Kumtichstraat x Kerkomsesteenweg. Gelieve alle wagens buiten de werkzone te plaatsen.

Vanaf 26 oktober zullen we de putdeksels ophalen in de onderlaag asfalt in de Koppeleikenstraat.

Het plaatsen van de betonverharding in de Kumtichsestraat is voorzien in de week van 25 oktober. Hierover ontvangt u een nieuwe brief. Na het plaatsen van de betonverharding zal deze afhankelijk van het weer nog een 2 à 3 weken moeten uitharden.

Samenvatting

Wanneer?	Wat?
Fase 1 – Koppelingenstraat en Kuntichsestraat	
18 oktober	Aanleg fundering lijnvormige elementen
19 en 20 oktober	Glijbekisting lijnvormige elementen Koppelingenstraat
20 oktober	Fundering rijweg Kuntichsestraat + kruispunt
21 en 22 oktober	Fundering rijweg Koppelingenstraat
25 oktober	Onderlaag + toplaag asfalt kruispunt Koppelingenstraat x Kuntichsestraat
25 oktober	Onderlaag asfalt Koppelingenstraat
Week van 25 oktober	Plaatsen betonverharding Kuntichsestraat

Van zodra er significante wijzigingen plaatsvinden ontvangt u een nieuw schrijven.

Van onze kant zullen wij ons uiterste best doen om de hinder tijdens de werken tot een minimum te beperken en mochten er zich toch moeilijkheden voordoen, dan kan u steeds terecht bij de werfleider ter plaatse, via het gratis nummer 0800 96 222 of via info@dcainfra.be.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten

Ben Goemaere

Vragen over deze werf? Bel 0800 96 222
Meer info? www.dca.be/ombudsdienst

